1.1资产运营职能模块及协同链路梳理 C-4
所有者：吕晓萌 最后修改：韩速 05-11 20:42

浏览 编辑

1.1资产运营职能模块及协同链路梳理

正文 5003 字（3.9 页） 附录 285 字（1.2 页） 注释 180 字（4 个） 浏览 85 次（4 人） 全部 >

AI 速览 点击生成文字速览（支持更多 风格切换 ）、脑图、播客，助你高效阅读。

目录

一、业务规划全景图
二、内外部协作链路图
三、具体分工及节奏
附录：其他榜单团队职能架构信息


一、业务规划全景图

【宣讲终版】榜单定位及举措讨论-251120.pptx
21.45MB

榜单矩阵运营规划分析-260126.pptx
19.02MB



二、内外部协作链路图

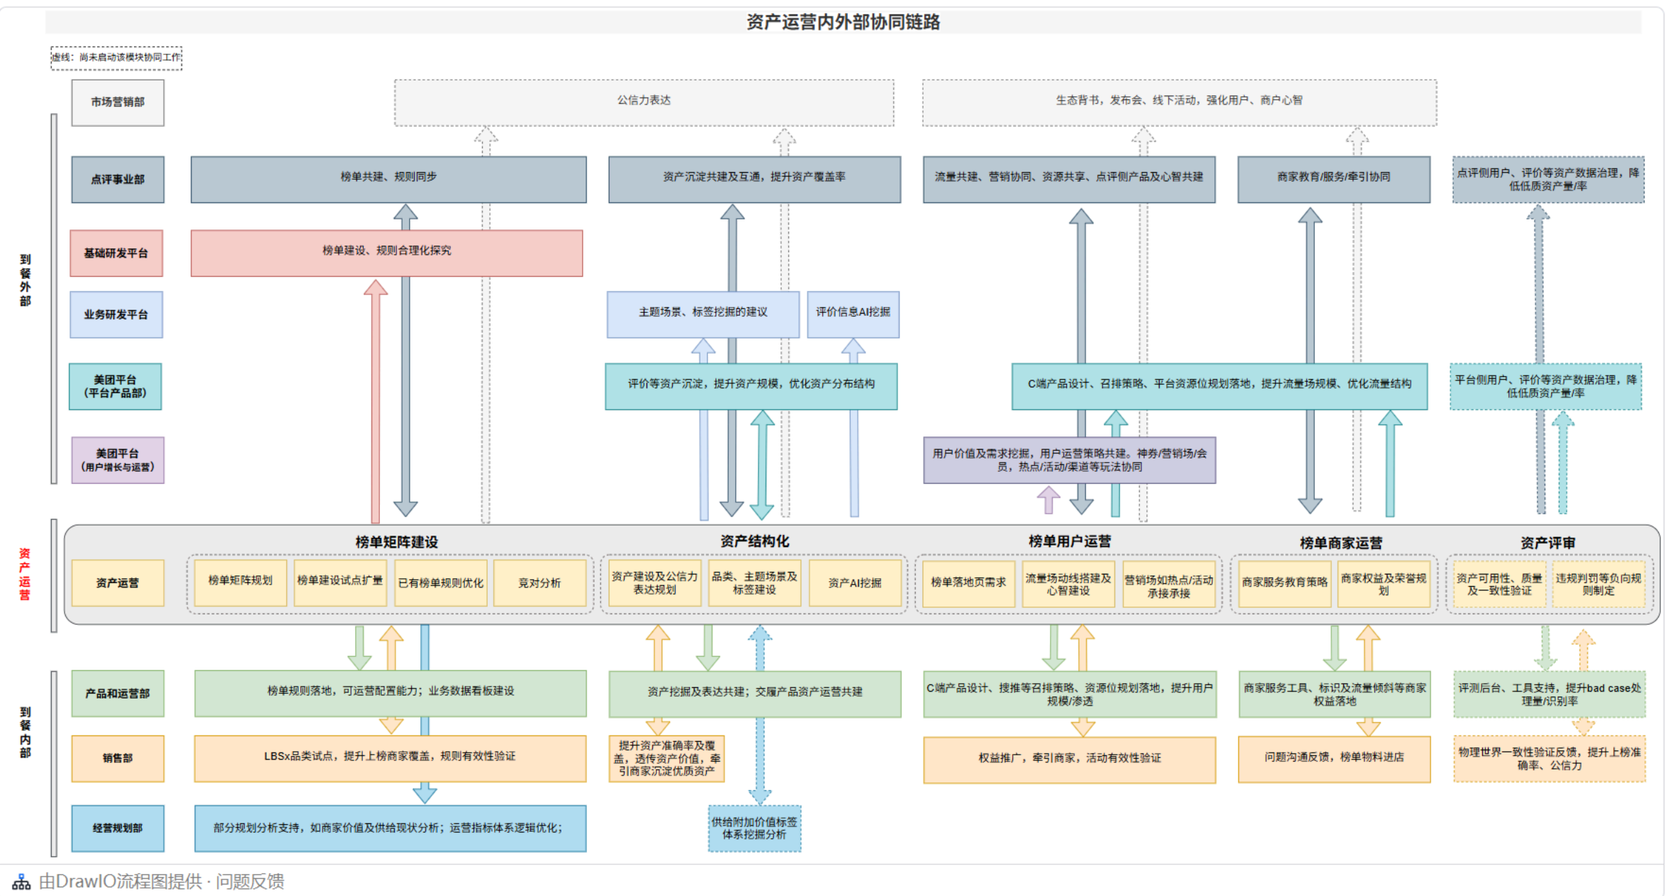

由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

基于协同链路分析， 资产运营协同方包括到餐内部及外部。其中，内部目前以产品侧、销售协同为主。产品侧，一方面聚焦在驱动榜单可运营落地，完善用户动线提升用户心智及强化平台公信力，另一方面集中在交履产品共建，提升资产“动态运营能力”，牵引商户合作；销售侧，主要在与销运及前线拉通榜单矩阵方向打造试点、供给牵引、共建与验证。经营规划侧，共识榜单矩阵方向并完善并迭代榜单指标体系，初步开展促评预算方案及榜单品类完善的协同。因到餐为非闭环组织，因此外部职能协同较多，点评侧目前以资产互通、共建为主，如异地、聚会等场景榜已开展合作；用增运集中在榜单营销及核心用户运营协同，目前在榜单日、榜单流量资源等方面已展开协同，后续就榜单营销能力，及神券、营销场、权益等会进一步丰富完善合作；美团平台在用户动线优化、资产沉淀等维度给予支持，目前已在大搜、AI搜、推荐、评论等方面陆续展开合作；研发平台给予数据挖掘、榜单规则合理化探究等支持。目前整体协作机制运行基本顺畅，但内部协同存在**资源供给较少、信息透传不足、观点不一致等问题，外部协同问题集中在信息敏感度较高导致共享受限**等问题，具体表现为：

到餐内外部	部门	具体协作情况描述	目前解决方案
到餐内部	**产品和运营部**	**1、用户产品组** **整体项目能持续推进，但过程中也暴露出一些问题：** ①人力资源相对有限[1]，面对资产运营组、用增营销组、销运组、下沉城市等多个榜单需求方时，当前需求吞吐能力有限，相对当前阶段、竞品及行业变化，仍只能按部就班的线性满足，排期较长，项目推进节奏受到一定影响； ②信息透传同步不足，造成资源浪费的同时，影响业务进度； *e.g.①产品团队正在测试“荣誉墙”功能，其策略为：当用户在大搜结果页点击POI卡片上的榜单标签后，将跳转至这一新建的荣誉墙页面。而该页面原先设计为直接落地至榜单页。此次测试会显著影响榜单流量，但由于未提前同步，榜单侧是在发现流量下降后通过回溯才得知产品团队有此动作；②关于发现页的主题挖掘，产品一直在挑战资产运营发现页已有的主题在榜单二次展示的价值，最后双方达成的一致是发现页正在挖掘的主题资产运营复用但需产品同步发现页的主题进展。后续资产运营和算法开会才知道发现页一直在挖主题深度，但产品侧一直没有透传过相关信息（目前仍扩量至10%，榜单流量进一步受到影响）* ③双方均有各自视角，部分场景较难拉齐，存在协作成本，未来需进一步磨合。 *e.g.针对产品侧提出的方案，资产运营曾多次要求提前对齐方案，但产品直接推进至交互阶段后才邀请资产运营参与共识讨论，后泽鹏解释是UI稿相较于原型图更易理解。会上，增长、下沉及榜单三个业务使用方均反馈该方案无法满足业务需求，然而产品团队仍坚持原方案，认为这样可以提升下次主访。该方案反复沟通多轮后，部分可解释方案各自妥协，但运营侧底线要求仍未对齐，仍并最终定版。*	目前已形成项目例会机制，定期同步进度及卡点；针对资产运营反馈的问题，产品侧hrbp张萌已与泽鹏沟通，同步了相关反馈，C端流量产品组负责人嘉铭也和辰辰做了深度沟通。未来产品和资产运营双方会持续优化协同机制，引导对接人强化协作意识，并跟进优化结果。 *注：从当下的时间和部分方案结果上，仍需进一步明确方案及节点*
		2、供给交易和营销产品组 **近期启动协作**，目前已完成初步汇报[2]，后续会围绕智能点餐、一键买单等交履产品，逐步建立与产品能力协同的资产“动态运营能力”。 *注：动态运营能力主要服务交履产品，沟通共识节奏上由交履产品主R，即确定区域x品类等标杆后，逐步铺设营销资源。这部分动态运营的能力，涉及流量空间和流量结构，主要协同方为用户产品组、平台、用增运*	-
		3、商家产品和运营组[3] 一方面商家服务涉及开店宝等商家后台优化，**方案整体较顺畅。**由于年夜饭专项资源紧张及原负责人离职，目前需要2月确定排期。另一方面涉及预排等非GTV导向的榜单牵引思路，初步达成一致。	到餐共建会及走访期间，与汉婷、张明沟通了如约会、聚会等场景榜对预排等非GTV导向的服务有商家牵引作用，初步一致，后续考虑结合试点
		4、销售系统和数据产品组 协同集中在竞品榜单数据采集[4] 及工具建设，**整体较顺畅。**	-
	经营规划部	**1、经营管理组** 部分较模糊、复杂的分析需要共建支持；同时支持资产运营指标逻辑梳理优化。**目前协同顺畅**，经营管理组会基于业务情况给予相应支持。资产运营也会结合其分析、发现的问题和结论优化运营策略	-
		2、业务策略组 **处于前期沟通阶段**，品类指数榜可基于供给定量情况，优化成榜逻辑；另外，未来围绕供给的新标签体系，可能涉及供给策略组共建互通。	-
		3、资源和目标管理组 涉及预算申请、方案同步及效果考核。目前与平台合作的促评方案已完成预算申请和方案同步。	
	销售部	目前主要围绕两个方面开展协同：一是榜单矩阵规划及方向的拉齐。如场景榜匹配销运的门店主题拆分和特色商家牵引目标（如异地、聚会等），指数榜匹配销运商家广泛牵引的目标，均有共同做功空间。同时，涉及榜单公信力与有效性验证、资产评估及策略优化等协同；二是前线做功围绕点评榜单为主的现状，通过强化美团榜单交易属性，结合交履产品目标及牵引，差异化区域x场景的榜单试跑，逐步加强美团榜单做功空间。 此外，双方已在商家教育、榜单物料等方面开展协同，**目前进展较为顺畅。** *注意：现有的产品框架仅支持基于人气榜/好评榜规则建设榜单，需要榜单落地页改版；*	除单独沟通外，机制上和王涛及王涛-1开展不定期互通会，目前已开展沟通，确认双方重点项目、目标，及榜单矩阵后续共同推进方向。
到餐外部	**点评事业部**	**整体事情能推进，但是也存在一些卡点：** ①点评侧信息敏感性较强，一些信息无法共享。目前主题榜相关数据资产可接入，但无法详细分享规则算法信息，尤其必吃榜，对资产互通造成一定影响。 *e.g.必吃榜流量数据、榜单规则算法详情。其余背景、规划等沟通后可分享* *②过往双方存在视角有差异，韩速与相关方持续高频沟通，目前关于场景榜、指数榜的优化方向**已与FM及FM-1互通详细方案及需求，达成共识。***	FM韩速与点评侧FM赵妍及赵妍-1持续沟通，加强共识，推动事情解决。
	美团平台（用户增长与运营）	用增运集中在榜单营销及核心用户运营协同，目前在榜单日、榜单流量资源等方面已展开协同，后续就榜单营销能力，及神券、营销场、权益等会进一步丰富完善合作，整体配合较顺畅，会持续跟进，并逐渐细化到建立可量化input指标的层面。	-
	美团平台（平台产品部）	美团平台侧支持业务方较多，会综合考虑资源位和流量等规划，目前已资源投放的方式已有如sug投放的合作。但产品化方案，仍受不同场景的优先级、排期等影响。时间会有一定不可控。	目前双方共识的结论是部分场景先以短期实验的方式拿到结果，平台侧再判断如何支持。但可推进性仍需进一步验证。

			榜单承接品类搜索需求，因借搜索团垂融合契机，已与泽鹏沟通，反馈Q1可上线。
	业务研发平台	**部分问题合并在用户产品组，其余目前协作相对顺畅。**	走访期间共同见证榜单和交履产品组合方案对商家牵引的价值，和负责人晓东进行深度沟通。认可并计划下周详细沟通敏捷机制
	基础研发平台	**目前协同相对顺畅。**	-
	市场营销部	目前尚未启动协作。	-

三、具体分工及节奏



由KityMinder思维导图提供 · 问题反馈

目标方向	子方向	关键举措/项目	承接人	关键指标	里程碑节点	预计完成节点	目前进度
榜单矩阵建设 **方向主R:** L8 **王辰辰**	**指数榜** **主R:** L8 **王辰辰**	指数榜单矩阵规划建设	**主R:** L8 王辰辰*0.6 **其他参与者:** L7 姚艺*0.3	完善榜单矩阵，扩供给覆盖，提升上榜覆盖率及核心商户上榜覆盖率	完成矩阵初步规划，确定节奏、方案。初步拿到、论证业务结果。	**元旦前：**完成榜单矩阵初步规划，将明确规则调整上线（品类等） **春节前：**围绕用户需求，进一步完善矩阵规划。探讨商品榜可行性，完成品类、AOI等扩大方案，达到可上线状态 *注：可上线状态为通过需求评审，具体上线时间受人力/产研周期影响，后同*	**元旦前：**已完成 **春节前：**预计3月27日上线
		指数榜单建设及竞对分析检测。指数榜：区域x新增维度	**主R:** L7 姚艺*0.7 **其他参与者:**		看清内外部现状及问题，沉淀工具及方法论。有效合理扩大区域覆盖，合理新增有公信力/牵引力的指数榜单，上线并回收效果	**元旦前：**①完成竞品分析及数据监控看板 ②完成商圈、热门地标覆盖的规则分析 **春节前：**①上线商圈、热门地标覆盖的规则分析 ②与数科建立一套上榜门店合理性的诊断方法 ③启动新维度榜单梳理（如复购/商品榜之一）	**元旦前：** ①已完成 ②已完成初步分析，节后推动和产品落地，delay原因为交履产品共建优先级提升 **春节前：** ①②已完成，③新榜单需要等产品总体榜单改版全部ready才会上线，产品计划3月底上线，所以2-3月期间会对复购榜先开始规则测试
		指数榜单建设。指数榜：品类x旧维度优化	**主R:** L7 刘思佳*1		明确优化方向并充分论证合理性，上线并回收效果。	**元旦前：**①完成美团榜单品类扩充规则制定及上线，上线后数据效果的回收 ②完成美团人气榜引入gtv排序因子的规则测算，及销售侧规则验证 **春节前：**①完成gtv排序因子的规则，达到可上线状态（试点城市） ②扩充品类，达到可上线状态	**元旦前：** ①已完成 ②已完成美团人气榜引入gtv排序因子的规则测算，销售侧规则验证待启动，delay原因为测算过程中指标不及预期，内部检核查找原因 **春节前：** ①完成gtv试点城市的选择及销售、销运、商服、客服的前置沟通，待产品侧排期；②同榜单落地页改版3月37日上线

	场景榜 **主R:** L8 **靳斯涵**	场景榜单建设规划	**主R:** L8 靳斯涵*0.5 **其他参与者:** L8 王辰辰*0.1 L7 朱雯漪*0.2		完成主题榜单规划，并跑通双平台合作。初步拿到、论证业务结果	**元旦前：**①完成双旦主题榜上线 ②哈尔滨冰雪季区域时令榜上线 ③点评主题榜接入规划及到餐发现页主题引入评估 **春节前：**①完成26年场景榜资产运营侧矩阵规划 ②优化异地旅游场景榜单，承接春节需求。③双旦/区域时令榜复盘优化确认是否覆盖全国及方案 ④围绕榜单矩阵沉淀餐内产研、用增、点评侧等对接流程及拉通联动。	**元旦前：**已完成 **春节前：**已完成
资产结构化 **方向主R:** L8 **靳斯涵**	-	评论、标签等资产建设及公信力表达规划	**主R:** L8 靳斯涵*0.3	新增资产门店占比 观测新增资产量、逐步到新增优质资产	完成初步结构性规划，与协同方有效建联规划专项	**元旦前：**①标签资产：双旦及哈尔滨冰雪季POI打标，通过榜单效果验证标签准确性；②联动平台、到餐内部完成评价资产标签需求梳理、对接流程。 **春节前：**①完成评论资产评估及提量、提质规划；②确认服务于场景榜单的标签生产SOP；	**元旦前：** ①已完成 ②已与平台联动完成评价资产梳理，到餐内标签体系较庞大，专项评估优先级不高，暂不启动。后续策略调整为在榜单落地进程中逐步对接 **春节前：** ①菜品榜优先级延后暂未启动 ②暂未启动 ③已完成协作分析，年后由智点团队发起
		主题场景及标签建设，含资产AI挖掘	**主R:** L6 韩廷衢*1 **其他参与者:** L8 靳斯涵*0.2 L5 林虹含*1 (汰换)		优化、新增多项主题场景及标签建设，形成主题榜单。通过AI完成多项重大主题挖掘，有效补充主题供给	**元旦前：**①双旦场景建表打标及AI挖掘，交付门店池 ② 时令场景哈尔滨冰雪季建表打标。通过以两个主题场景榜的建设，完成场景榜单整体规则及打标流程梳理 ③与研发、产品团队对齐AI挖掘方案及合作策略 **春节前：**①与产品团队、研发团队确认全年主题场景，并建立合作机制，初步试跑场景主题的产研配合链路，沉淀高效的主题能力。②与FDC进行长期建表规划，沉淀标准化建表SOP。③确认产研全年AI主题挖掘计划及时间节奏（长期规划，依赖研发排期），打磨性价比高的主题挖掘配合流程并跨部门达成一致可启动年后挖掘。④年前产出有效的场景挖掘案例	**元旦前：**已完成 **春节前：**已完成
		评论资产建设及运营	**主R:** L6 陈永洁*0.5		完善评论资产建设	**春节前：**到餐商户评价现状的全景分析，并明确后续策略方向	
		了解产业数字化能力，识别当前资产表达不足之处，包括商家数字化及平台数字化，从认知到计划到检核节点	*空缺*	*资产有效性、准确率*	*未启动*	-	-
		资产可用性、质量及一致性验证	*空缺*		*未启动*	-	-
		违规判罚等负向规则制定	*空缺*		*未启动*	-	-
资产动态运营 **方向主R:** **待招** L8 *王辰辰（暂代）*	-	榜单落地页需求及用户动线产品统筹	**主R:** L8 王辰辰*0.3		新版上线及效果论证	**元旦前：**明确改版需求，提升用户决策体验，兼顾营销能力 **春节前：**确认C端榜单落地页方案，达到可上线状态。完成大搜、POI、推荐动线优化	**元旦前：**已完成 **春节前：**预计3月27日上线
		营销场如热点/活动承接承接	**主R:** L7 朱雯漪*0.8	榜单用户规模、转化及渗透	与协同方有效建联开展专项，显著提升榜单营销心智，上线并回收效果	**元旦前：**建联资源方，完成“双旦”、“冰雪季”的营销流量方案及上线 **春节前：** ①完成年前临时活动资源复盘 ②承接春节旅游需求 ③完成场景、主题榜单活动承接长期方案，拉通到餐用增及产品、平台侧、点评侧的整体运营初步策略方案，摸盘资源空间及规模	**元旦前：**已完成 **春节前：**已完成
		流量场动线需求落地	**主R:** **待招** L6 *陈永洁（暂代）*0.3*		与协同方有效建联开展多项专项，显著影响用户决策动线，上线并回收效果	**元旦前：**完成现有链路中大搜渠道sug能力的品类榜单承接 **春节前：**拓展大搜结果页中筛选、推荐及AI问答能力的对接调研，明确对接方案。待开放平台能力建好后才能启动，	**春节前：** ①搜索结果页榜单筛选项2月25日已上线；②问小团目前不接受业务需求，因此节前优先和站外GEO合作完成当地人推荐和特色菜的榜单投放
		商家服务及商家教育	**主R:** L6 陈永洁*0.2	NPS、负反馈率	驱动产品工具优化上线，搭建辅导手册模板及沟通机制，并开展应用	**元旦前：** ①完成现有榜单for商家的一页纸设计并确认资源位投放 **春节前：** ①通过销售工具及开店宝对商户进行榜单规则宣导 ②开店宝中商户榜单诊断工具达到可上线状态 ③摸盘商户榜单、差评等资产反馈、申诉链路，提出优化方案	**春节前：** 暂未完成，产研资源有限，其中① 通过公众号透传； ②产品delay，原因是负责的同学活水，资源不足

正文结束

附录：其他榜单团队职能架构信息

1、美团内部

①黑珍珠：12人，包括产品、运营、商户拓展、市场营销职能。协同方集中在到餐外部，以点评事业部、市场营销部、业务研发部为主；


②必吃榜：8人，包括产品、运营职能；协作链路尚不清楚；

③点评指数榜单：24人，产品为主，少部分运营职能；协作链路尚不清楚；

2、美团外部

①D+心动榜：10+，市场传播职能为主，另有支持团队：数据算法，20人；BD，20人+，餐厅邀请；行业运营，~20人

架构设置及协同方（标红为涉及榜单部分）

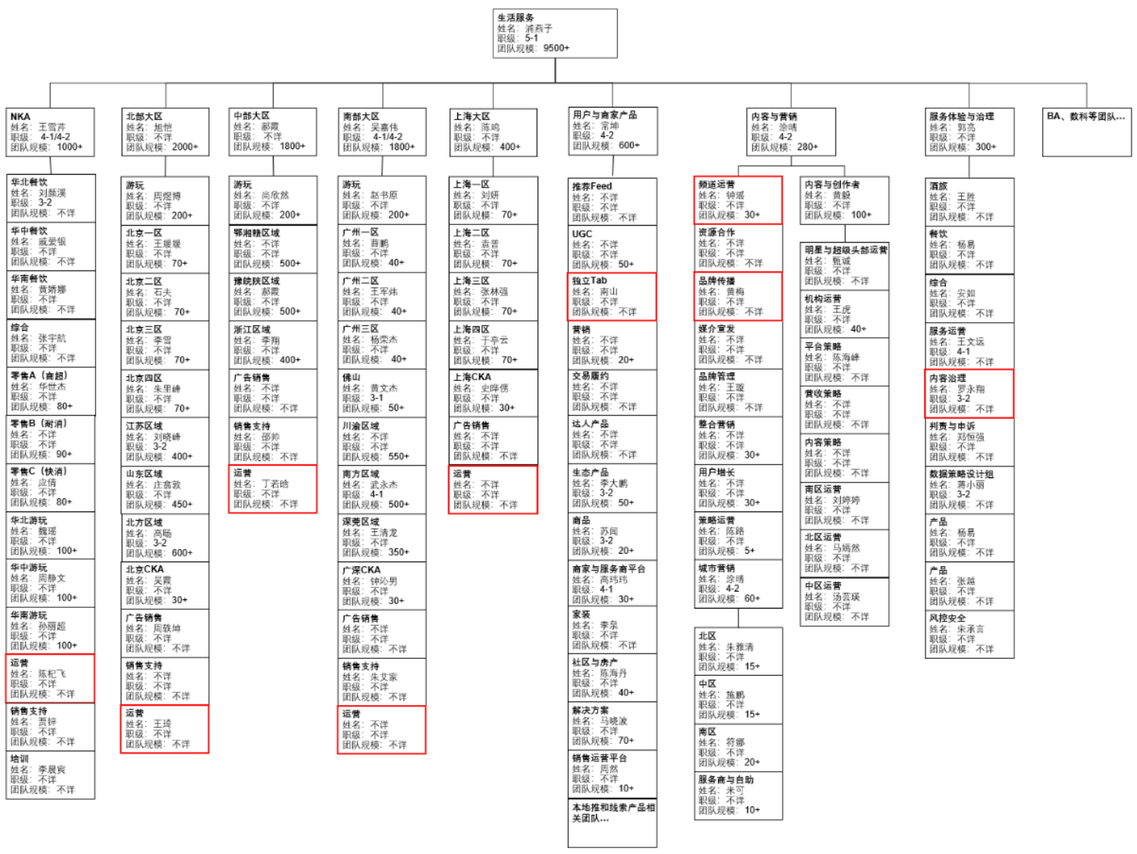

②D+甄选榜（暂停）：20+，内容运营为主，另有支持团队：商家赋能BD，~10人，商家邀请/权益申请/商家冷启动支持；内容运营+市场部+BD，~10人，评委邀约

③B+扫街榜：信息业务部主要负责，截止930，业务群内35人，包括内容、商家供给、行业运营。

架构设置及协同方（红框为主责方，蓝框为协同方）



注释：

[1] 产品：3个正式人力；
研发：后端2.5人，前端1人+1实习生

[2] 汇报：基于智能点餐的榜单资产影响分析

[3] 商家产品和运营组：近期开展年夜饭预订的专项（美食频道-订年夜饭原为热订榜）。

[4] 竞品榜单数据采集：目前B+状元榜、D+心动榜更新频次低，已采集。D+烟火榜城市x门店共360家，资产运营已手动梳理。B+指数榜只采集到B+城市维度为主，更细区域粒度无资源或采集不准确（受对方风控机制等限制），D+指数榜，其它主题榜目前无资源或采集不准确
