260901 AIBD 新签阶段性进展 C-4
所有者：范芳剑　最后修改：郑陶陶 09-01 09:51

260901 AIBD 新签阶段性进展

正文 1466 字（0 页）| 附录 337 字（0 页）| 注释 559 字（8 个）| 浏览 116 次（29 人）| 全部 ›

AI 速览 **新签 L2 试点范围与推进节奏确认：** 当前试点选定“新签”场景，在北京面向 6.5 万门店验证「Agent + 线上销售 + 地面销售」协同模式，已组建 12 人端到端 STL 团队。后续计划为 9 月底完成电销

一、项目背景

1.AIBD L2 探索


当前销售方向 AI 建设是按电销、蜂窝、品牌组织全面铺开单点 L1 提效，路径均已完成验证[1]，例如电销的意向嗅探、蜂窝的智能作战，品牌的服务报告。下一阶段将聚焦单模块的 L2 深度突破，让 AI 从「销售工具」融入「销售工作流」，参与任务分配和过程跟进，同时推动销售作业模式从「门店固定归属某个兵种」转向「根据门店分层、处理难度和任务阶段动态调度资源」。建立一套可规模化复制的销售作业方式：面向 L2 流程，探索资源池共享，「Agent+电销+地面」混合作业的新销售范式，通过对照实验确认对销售效率、GTV 的贡献。

2. AIBD L2 新签

针对 L2 验证场景，先对全量销售任务做了盘点[2]，最终选定新签。核心依据：AI 可实现度高（作业流程标准化程度高、数据和工具基础较完善）、作业链路和结果指标相对独立。

因此针对新签场景，组建一支 12 人端到端的业产研 STL 团队，联合蜂窝、电销两个 BDM 小组，在「北京」面向 6.5 万门店验证「Agent + 线上销售 + 地面销售」协同模式是否成立。

图表1：AI作业场景选择矩阵：基于“AI可实现度 × 任务独立闭环度”判断不同场景的AI介入方式

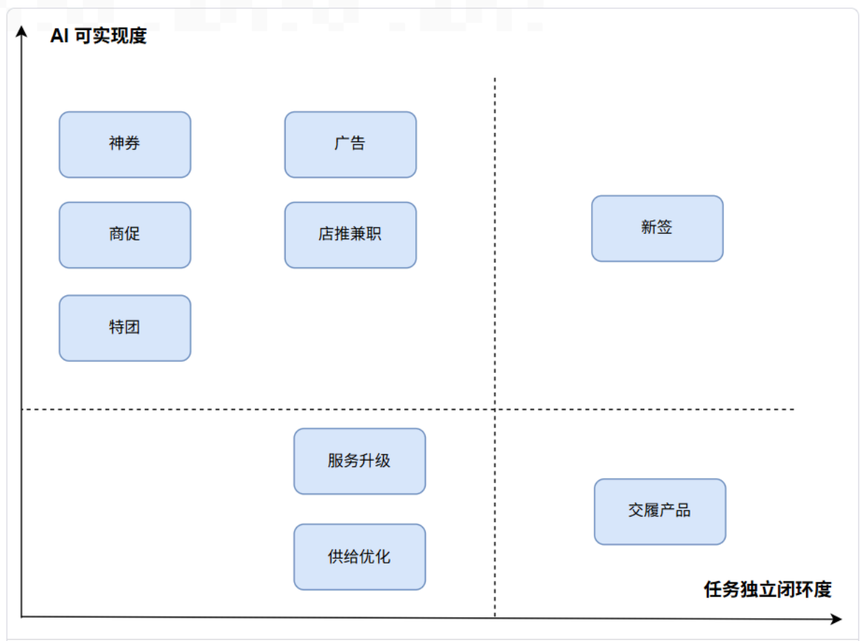

由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

二、项目目标

定性：建设「Agent + 线上销售 + 地面销售」混合作业模式和 STL 项目运作模式

1.业务价值： Agent 参与销售作业后，提升有效新签数量、关键流程转化或销售作业效率并形成相对现有模式稳定增量

2.协作模式： Agent、电销和地面之间的任务边界、客户归属、交接条件和异常处理机制能在真实销售流程中跑通

3.技术能力： Agent 在任务成功率、延迟[3]、成本和安全性方面满足业务要求

4.组织机制： 试点项目销售形成了稳定的权责利，业产研全职 STL 团队有效运行

5.规模化条件： 沉淀可复制的销售作业模式、人机协作产品[4]、Harness 能力、评测体系[5]和组织机制[6]

定量：改变销售组织的作业模式和商家资源划分规则，使用一半人力完成相同新签目标门店

1.输出指标：有效新签门店数

2.输入指标：同等时间，加微数、入驻数、上单数均大于现状，专员正确接管率符合预期


3.观测指标：违规率不高于现状、销售转型为新签 AI 专员不少于 50%、门店 GTV 产出不低于平均值

三、方案与进展

1.阶段实验进展：完成初版 L2 Loop「上店流程」上线和实验，每小时加微数、入驻数「AI+人」对比「人+AI」提升约 4 倍[7]（但由于实验早于 STL 成立，客户资源和销售专员不固定，数据不能代表最终结论）。

2.产品能力进展：全链路包含「意向确认→客户建联→合同入驻→银行卡和菜品信息收集→团购上单」，当前已完成从意向确认到合同入驻的 L2 上店流程建设。进入到业务策略设计细节（商家交互规则、Agent 沟通规则、人机交接方案等），开始 Loop 所需模型训练，全流程 AI+人初版 AB 实验进行中。

图表2：新签 L2 前后流程对比

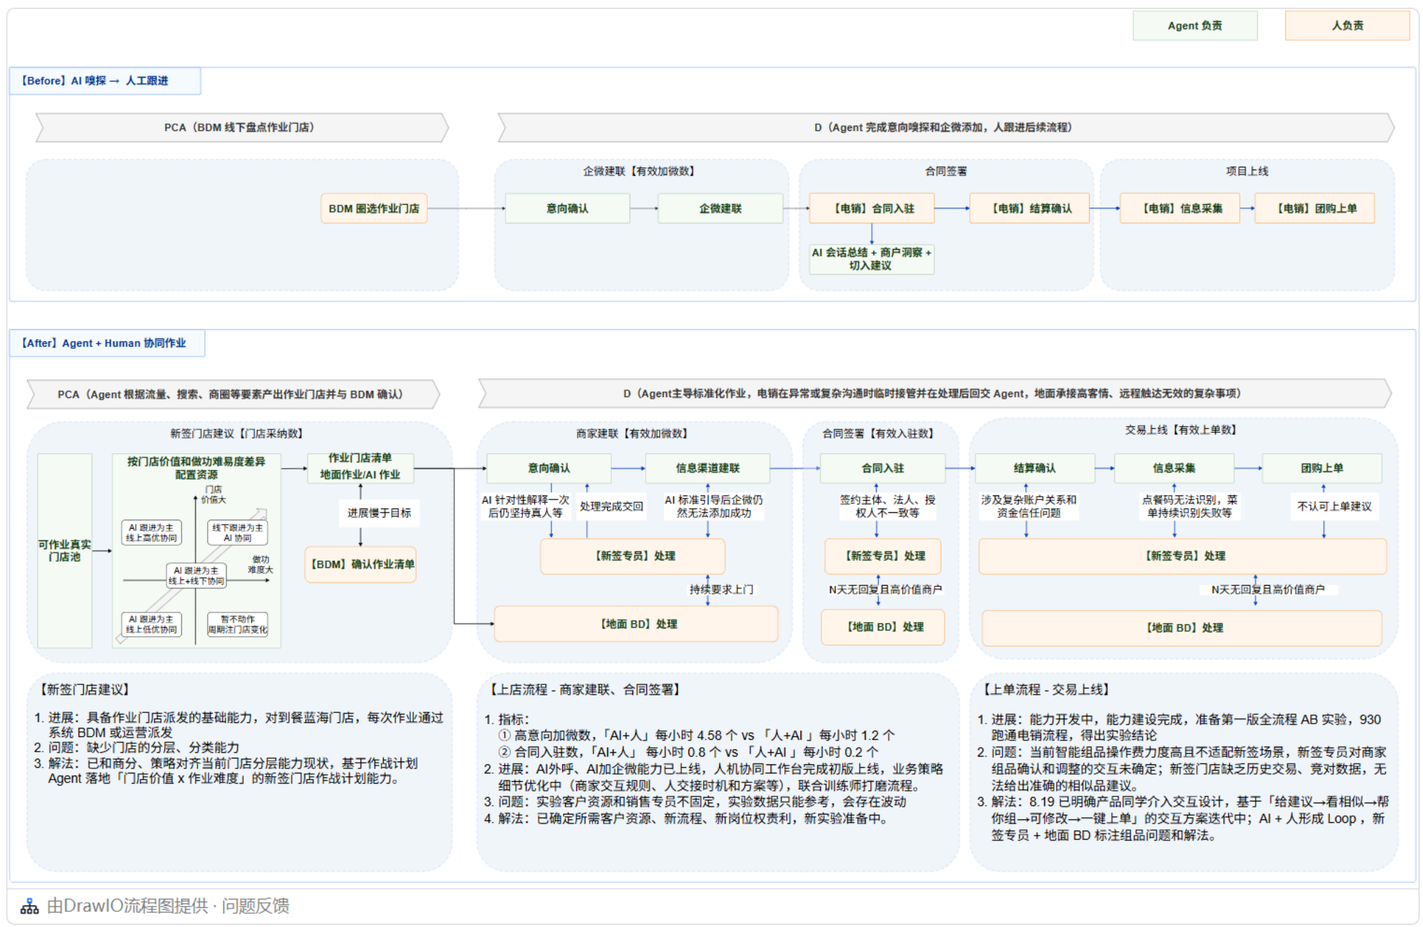

由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

四、关键岗位和职责变化

1.AIBD 新签 STL：8.20 组织搭建完毕，内部角色有 ① 领域专家（由原产品担任），负责业务流程抽象定义、规则沉淀和验收标准。② Agent 专家（由原研发担任），负责 Agent设计、评测方案设计和定义初版评测集。③ 业务专家（由原 BDM 和业务运营担任），数据治理、知识库沉淀和校准业务流正确性和评测集设计。

2.AIBD 新签训练师：已确认新签场景训练师人员（由原 BD 和 BDM 担任）。由原来的模型评测和标准，迭代为基于最小 Agent Loop 单元的业务子目标对话准确性和目标达成情况的标注流程，标准和动作校准中。

3.AIBD 新签专员：新实体组织已确认，完成新岗位职责、新绩效设计。新岗位聚焦与 AI 协同完成上店+上单流程，绩效组成为新签结果和过程完成情况、人机协同交互和反馈情况、与 STL 团队的协同贡献。

五、后续计划


1.电销实验：9 月底给出「Agent + 电销」端到端 L2 实验在业务价值、协作模式、组织机制的初步结论。

2.地面扩展：10 月基于地面门店池，组建「Agent + 地面 + 地面线上作业」团队，完成新岗位职责、新绩效设计，开始实验。11 月打通电销和地面门店池，组建「Agent + 电销 + 地面」团队，开始实验。

3.连锁扩展[8]：10 月梳理连锁新签场景在上店+上单环节的操作流程和可复用能力，11月跑通一个 连锁新签流程 ，降低连锁商家上店和上单费力度，缩短入驻周期。

4.模块扩展：新签模式跑通后，优先延伸至后续新店成长涉及的「AIBD 广告新签」、「AIBD 神券」等模块并完成规模化落地。

图表3：AIBD 后续场景扩展介绍

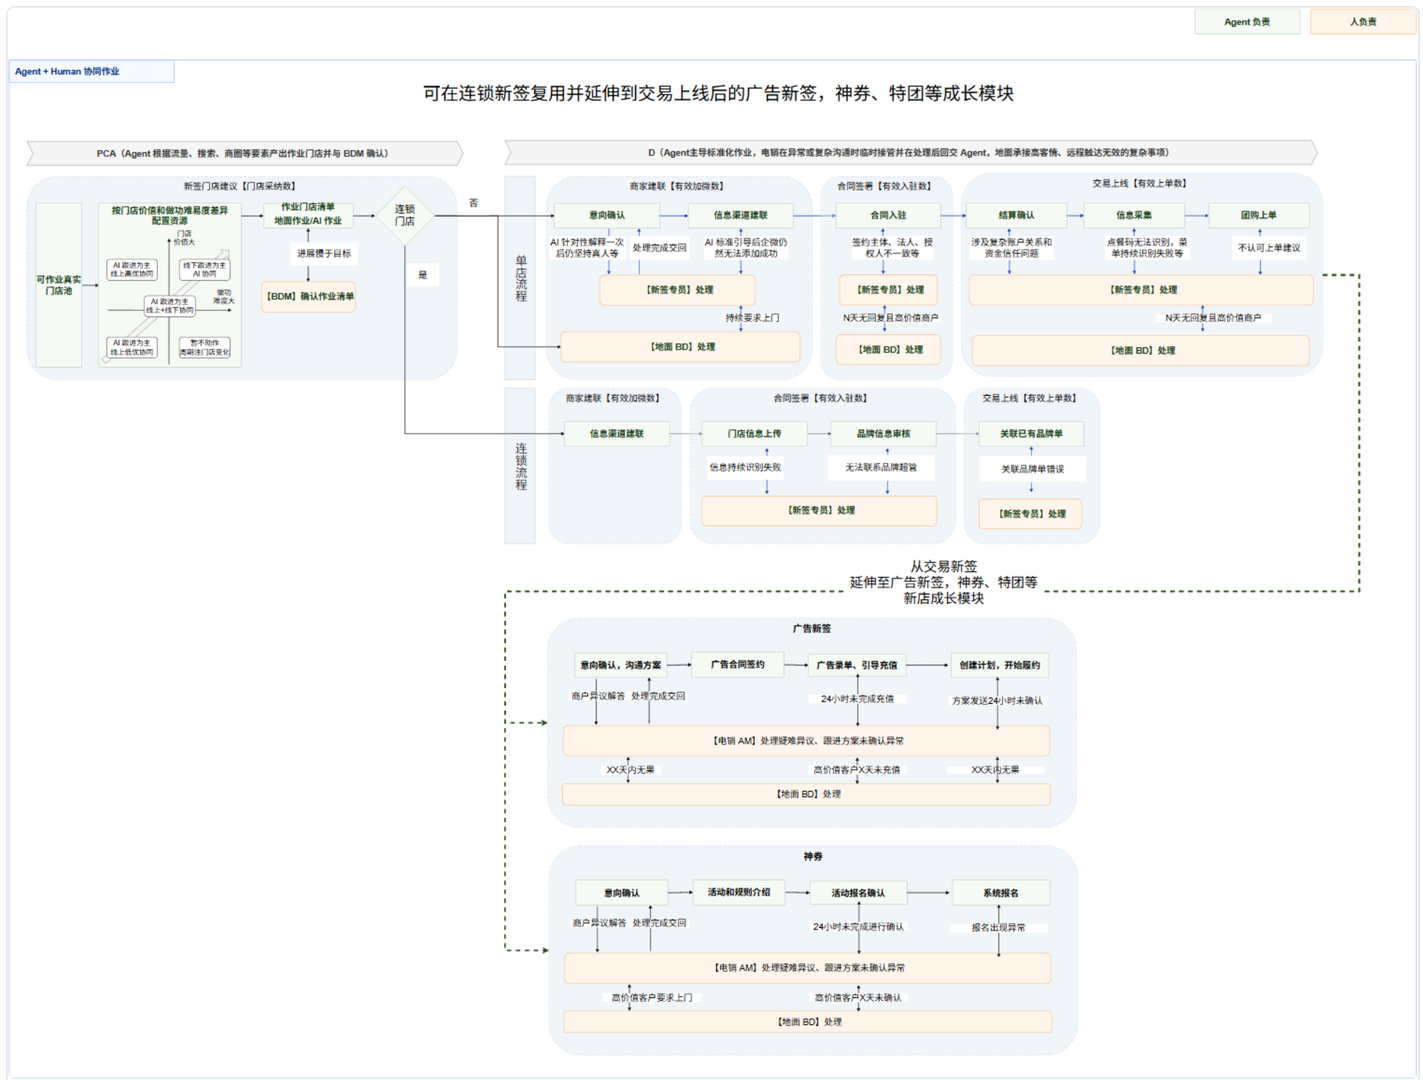


由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

正文结束


附录

附录 1 AIBD 新签 STL 组成

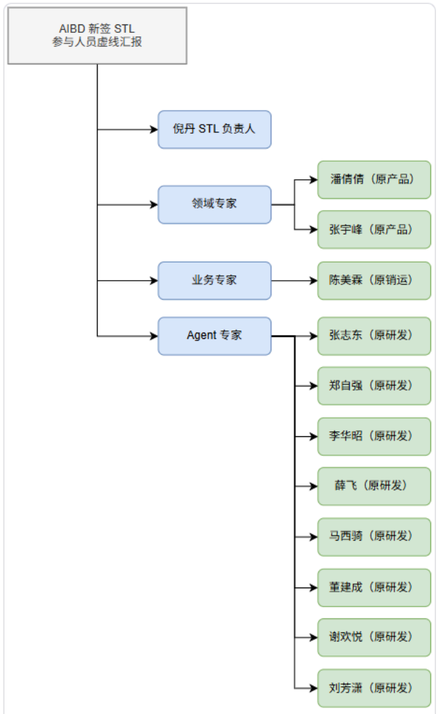


由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

附录 2 业务 Loop 细节

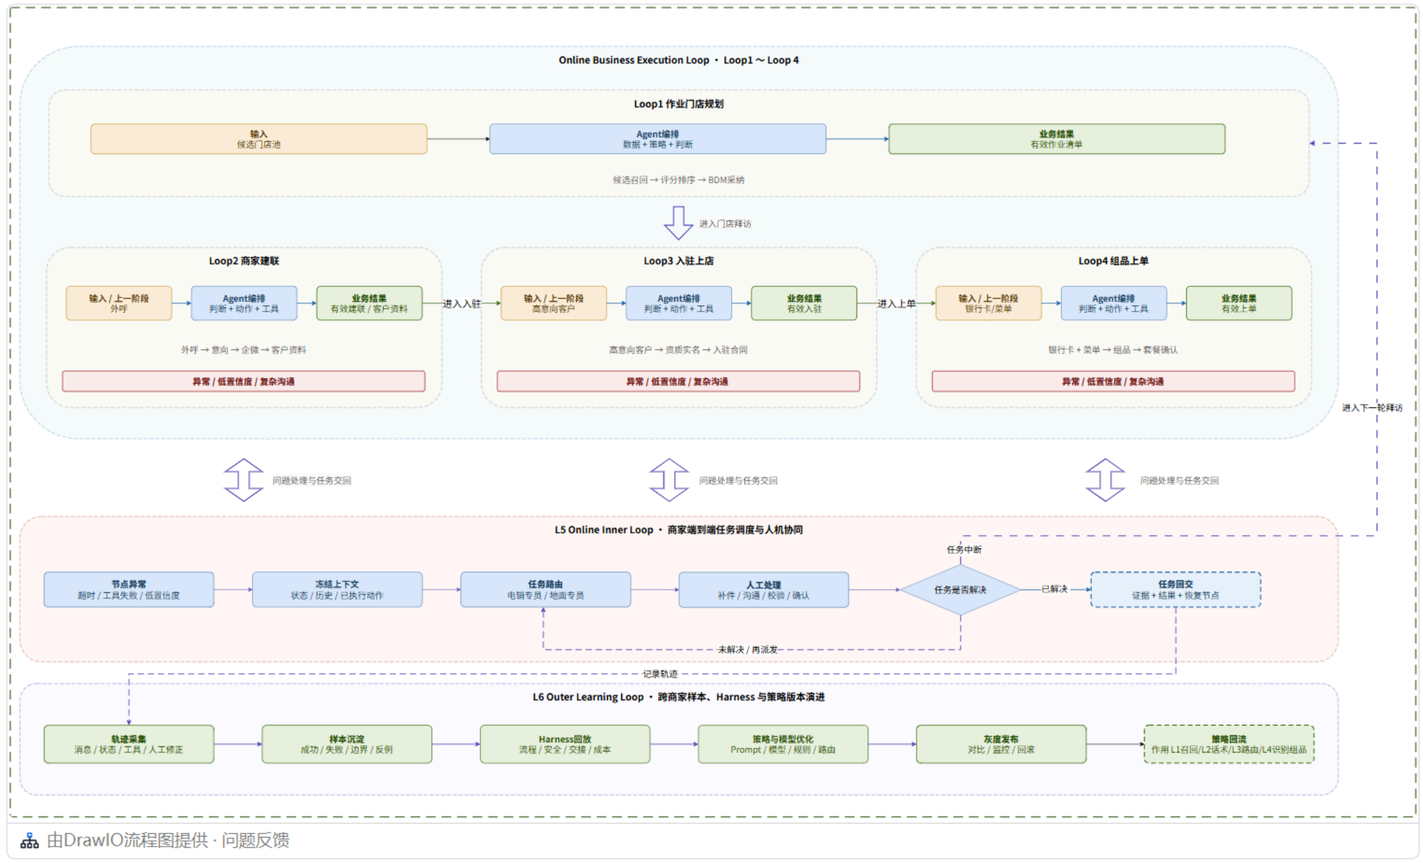

由DrawIO流程图提供 · 问题反馈

附录 3 技术架构细节

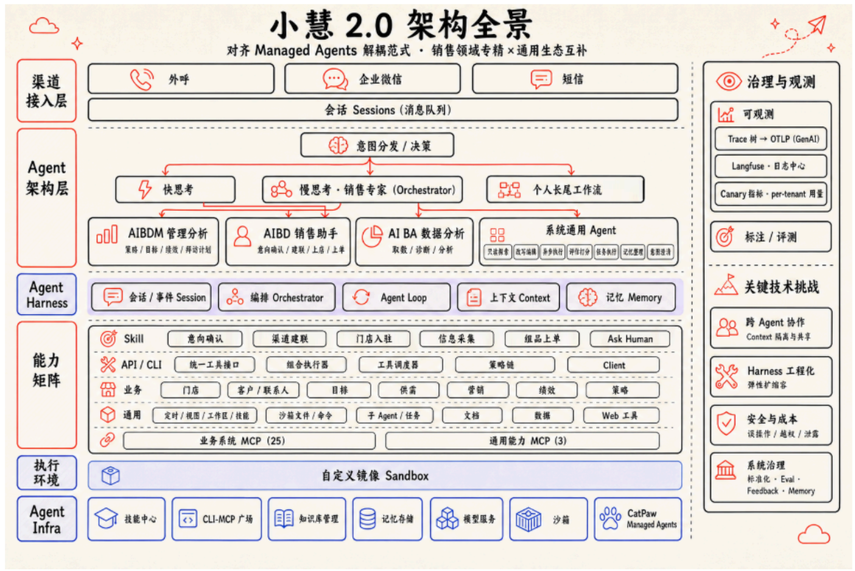

附录 4 实验方案细节

指标	实验组（L2 新签）	T+1 跟进组（L1 新签）	纯人跟进组（无 AI）
累计工作时长	12 小时 4 分钟	11 小时 58 分钟	5 小时 52 分钟
企微添加数	164 个（2.2%） AI 触发 113 条；真人触发添加 34 家；专员二次追加 17 个；	47 个（1.1%）	10 个 杨宁触发 3 家；孙经会触发 7 家
每小时添加企微数	13.67 个	3.93 个	1.70 个
企微添加成功数	55 个（33.5%） AI 建联成功 26 家（单聊 10、群聊 16）；真人人工复核成功 19 家；专员二次追加成功 10 个；	14 个	9 个（90.0%） 杨宁成功 2 家；孙经会成功 7 家
每小时企微添加成功数	4.58 个	1.2 个	1.53 个
入驻完成数（含历史已入驻）	10 个（18.2%） AI 建联成功 1 家；专员入驻 6 家；二次追回 3 家；	2 个（14.3%） 跟进备注明确已上线 2 家（按 POI 去重）	-
每小时入驻数	0.8 个	0.2 个	-

附录 5 绩效方案细节

【电销中心】L2-人机协同人员&机制试点方案

附录 6 案例示意

展开细节





注释：

[1] 已验证：

1、电销验证 AI 可交付真实业务结果，外呼成交率对标入职 3 个月销售，累计 GTV 6,006 万元，自闭环率 6.25%

2、品牌验证专业服务可标准化，报告由人工大半天转为 AI 自助生成，近两周覆盖 226 品牌、146 活跃 BD

3、蜂窝验证前线作业可系统化提效，双城数据模块使用率 100%，管理者人均提效 50%、每日省 1 小时数据整理时间。蜂窝推全 9 月启动，届时提效能力覆盖全量蜂窝前线。

[2] 做了盘点： 探索方向AI能力与作业独立性盘点

[3] 延迟：语音交互耗时不超过 2s

[4] 人机协作产品： https://leads.meishi.test.sankuai.com/multica/tt-board/new-store-growth

[5] 评测体系：

1. 业务维度：端到端新签率、各环节的任务成功率、接管 SLA
2. 技术维度：路由准确率、人机交接正确率、任务耗时

已有的评测能力：

1. 标注和评测： https://salesmind.sankuai.com/aibd-workshop/tasks/2734
2. 会话分析： https://60005-mbbcr-sl-leads.meishi.test.sankuai.com/aibd-agent/loss-analysis ， 批次 123606
3. 模型评测： 新签-多模型评测记录 ， https://salesmind.sankuai.com/aibd-workshop/datasets/640/detail
4. 知识库评测： 到餐-评测场景

迭代中的评测能力： 基于真人销售作业的流程共创规则 ，完成 开场破冰+需求探询 、 签约促成添加企微+签约资料收集与入驻 、 签约操作+餐型完备 标准流程，构建 新签 L2 评测流程 中。

[6] 组织机制：当前 AI 训练师的绩效方案 AI训练师绩效方案

[7] 「AI+人」对比「人+AI」提升约 4 倍：见附录 4

[8] 连锁扩展：

核心差异：连锁门店新签难度在上店环节4个必要前置条件操作耗时较长；上单部分因品牌通单能力，关联后即可自动上单。

AI能力扩展：加盟门店的单店关联，介入重点在上店环节，关于双证、门店信息、结算账户环节介入。①引导商家在商家端操作指引上店；②成功率低则走AIBD新签链路，转AI外呼和电销的新签团队引导上店。
